



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bewonersgroepenoverleg

Knooppunt Hoevelaken

26 oktober 2011



Agenda 26 oktober

- Waarom nieuwe aanpak?
- Aanpak op hoofdlijnen
- Belangrijke mijlpalen
- Participatieproces
- Vervolgacties (korte termijn)



Waarom nieuwe aanpak voor Hoevelaken

- Begin 2011 referentieontwerp gereed en geraamd op € 1100 mln. Te hoog t.o.v. beschikbaar budget (€ 800 mln incl. BLD -> € 676 mln excl. BLD in nieuw MIRT projectenboek)
- Geen extra geld van Minister. Versobering noodzakelijk!
- Voorjaar 2011 versoberingsopties onderzocht. Pakket gevonden van ongeveer € 300 mln:
 - compacter dwarsprofiel, minder ingrijpend
 - meer bestaande elementen gebruiken (o.a. kunstwerken, verharding)
 - lagere ontwerpsnelheid (100km/u i.p.v. 120km/u) op A28 zuid
- Mei 2011: Minister besluit in overleg met Regio de markt vroegtijdig bij het project te betrekken (vervlechten van planprocedure met aanbesteding).




Doel vroege marktbetrokkenheid (vervlechten)

- Meer waar voor het geld
- Prijszekerheid
- Versnelling geen doel



Oude en nieuwe aanpak Hoevelaken

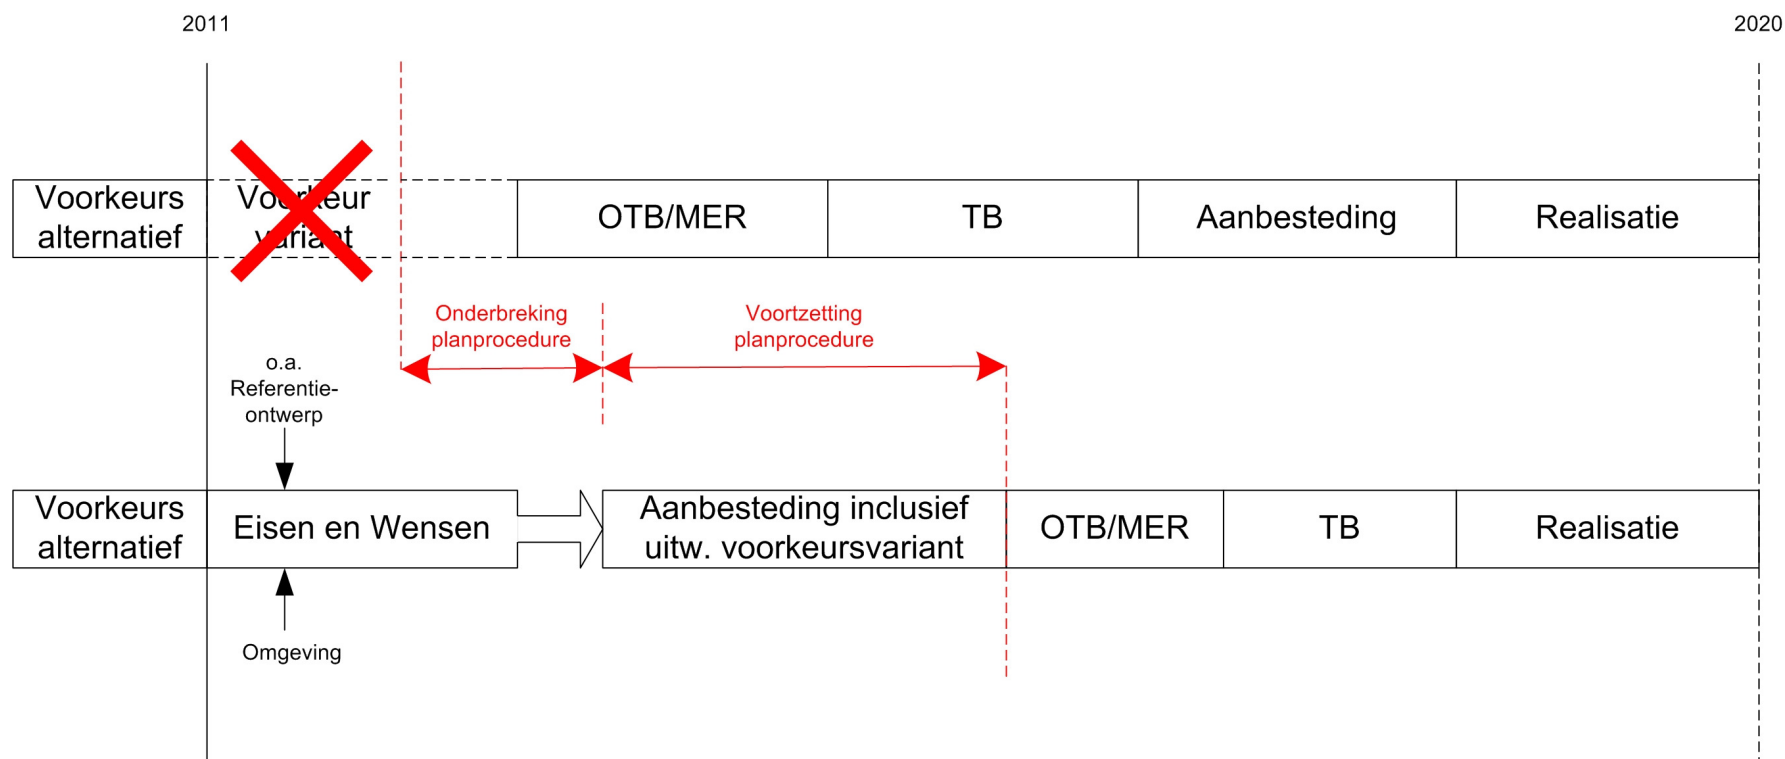



Wat betekent vervlechten voor de voortgang?

- Planprocedure Hoewelaken wordt tijdelijk stopgezet
- Gezamenlijk met regio formuleren van programma van eisen en wensen tbv marktuitvraag
- Markt uitvragen om aanbiedingen te doen
- Welke marktpartij kan voor het beschikbare budget het meeste bieden (eisen + wensen)?
- Na selectie van de beste aanbidding voortzetting planprocedure
- Markt is betrokken bij verdere planuitwerking Tracewet-procedure
- Na doorlopen Tracewet-procedure start markt met uitvoering




Aanpak op hoofdlijnen

- Versoerd ontwerp binnen wettelijke eisen en beschikbaar budget
- Programma van Eisen (financieel gedekt) en Wensen (gewogen), beoordelingskader
- Bestuursovereenkomsten (BOK)
- Uitvraag aan de markt -> in principe partij die meeste wensen invult wint
- Opdracht aan de markt bevat:
 - Winnende ontwerp uitwerken in voorkeursvariant
 - (O)TB/MER opstellen tbv planproces
 - Bouwen van de oplossing
 - Beheer en onderhoud



Mijlpalen

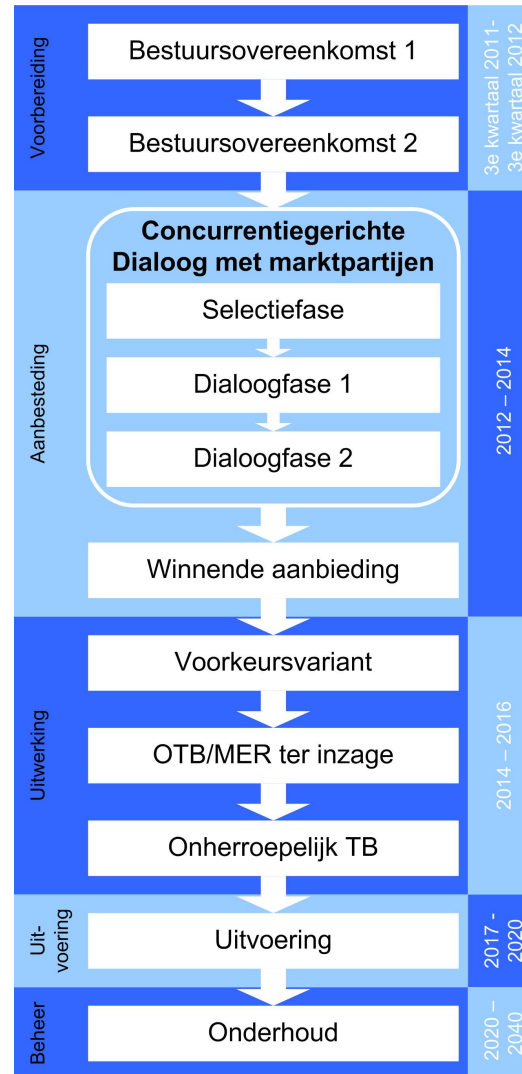



Participatieproces: voorbereidingsfase

- Klankbordgroep(en) bestaande uit belangenorganisaties en bewonersgroepen:
 - Beoordelingskader -> consulteren
 - Eisen -> informeren
 - Wensen -> consulteren
 - BOK 2 -> informeren
- Bestuursovereenkomsten worden voorgelegd aan Raden en Staten
- Brede omgeving -> informeren



Participatieproces: aanbestedingsfase

- Ideeën + uitwerking derden tav knooppunt Hoevelaken (zoals die van SHBL) inspiratiemateriaal voor marktpartijen.
- Daarnaast idee om bij marktconsultatie en/of start dialoofase 2 de SHBL (en eventuele andere organisaties met concrete ideeën) de gelegenheid te geven hun ideeën aan de marktpartijen te presenteren.
- Tijdens dialoofgrondes omgeving informeren over voortgang, niet over inhoud.



Participatieproces: uitwerkingsfase

- Klankbordgroep en brede omgeving consulteren over winnende bieding
- Formele inspraak op (O)TB/MER



Vervolgstappen korte termijn

- Vaststellen gezamenlijke aanpak vroege marktbetrokkenheid intern RWS/I&M
- BOK 1 afronden
- Participatieproces verder uitwerken
- Versoepd ontwerp maken
- Starten met uitwerken beoordelingskader, programma van eisen en wensen tbv BOK 2
- Aanbesteding uitwerken



Vragen?

- Hoe kijkt u als bewonersorganisatie aan tegen de nieuwe aanpak voor Hoevelaken?
- Wat vindt u van het idee om een klankbordgroep in het leven te roepen waarin zowel bewonersgroepen als belangenorganisaties participeren? Zou u aan de klankbordgroep willen deelnemen?
- Wat vindt u van de wijze waarop uw betrokkenheid bij het project nu is voorzien?
